

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	22/11/2022
Obra:	Obra de pavimentação de ruas em pavimento intertravado localizado no Bairro Ave Maria, no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araujo Braz e na Rua Julio Souza Abreu no Município do Carmo-RJ
Endereço:	Bairro Ave Maria, no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araujo Braz e na Rua Julio Souza Abreu no Município do Carmo-RJ
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART - 2020220239272
Numero do contrato:	0525/2022
Numero da tomada de preço:	0008/2022
Numero da ordem de serviço:	007/2022
Prazo:	05 meses
Início:	10/10/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	10/03/2023
Valor:	R\$ 152.395,59
Termos aditivos:	-
Valores Pagos:	R\$ 64.454,00 (Primeira Medição – 17/11/22)
Percentual executado:	42,29%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 310/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	RRT - 12600392
Tipo de recurso:	Recurso próprio

Carmo, 22 de Novembro de 2022

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









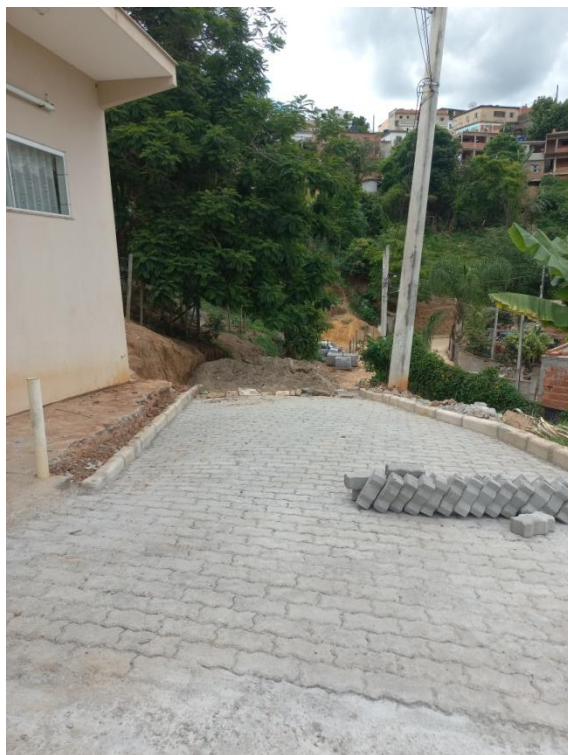



Carmo, 22 de Novembro de 2022

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA
