

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	16/05/2023
Obra:	Obra de adequação e reforma da Escola Municipal Barra de São Francisco, na Rua Sebastião Ferreira da Costa, nº200, Barra de São Francisco, Município de Carmo-RJ.
Endereço:	Distrito Barra de São Francisco, Rua Sebastião Ferreira da Costa, nº200, Município de Carmo-RJ.
Empresa:	PMV CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020220238416
Numero do contrato:	0521/2022
Numero da tomada de preço:	0005/2022
Numero da ordem de serviço:	003/2022
Prazo:	04 meses
Início:	04/10/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	30/07/2023
Valor:	R\$ 184.310,97
Termos aditivos:	1º Termo Aditivo Prazo = prorrogação de 60 dias 2º Termo Aditivo de Valor e Prazo = R\$90.732,16 e prorrogação de 60 dias 3º Termo Aditivo de Prazo: prorrogação de 60 dias
Valores Pagos:	R\$ 28.104,09 (Primeira Medição - 28/11/2022) R\$ 53.522,22 (Segunda Medição - 29/12/2022) R\$ 42.855,43 (Terceira Medição - 13/02/2023) R\$ 34.004,12 (Quarta Medição - 20/03/2023)
Percentual executado:	63,80% (Incluindo contrato + Termos Aditivos)
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 345/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	ART - 2020220287362



P R E F E I T U R A
CARMO
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA

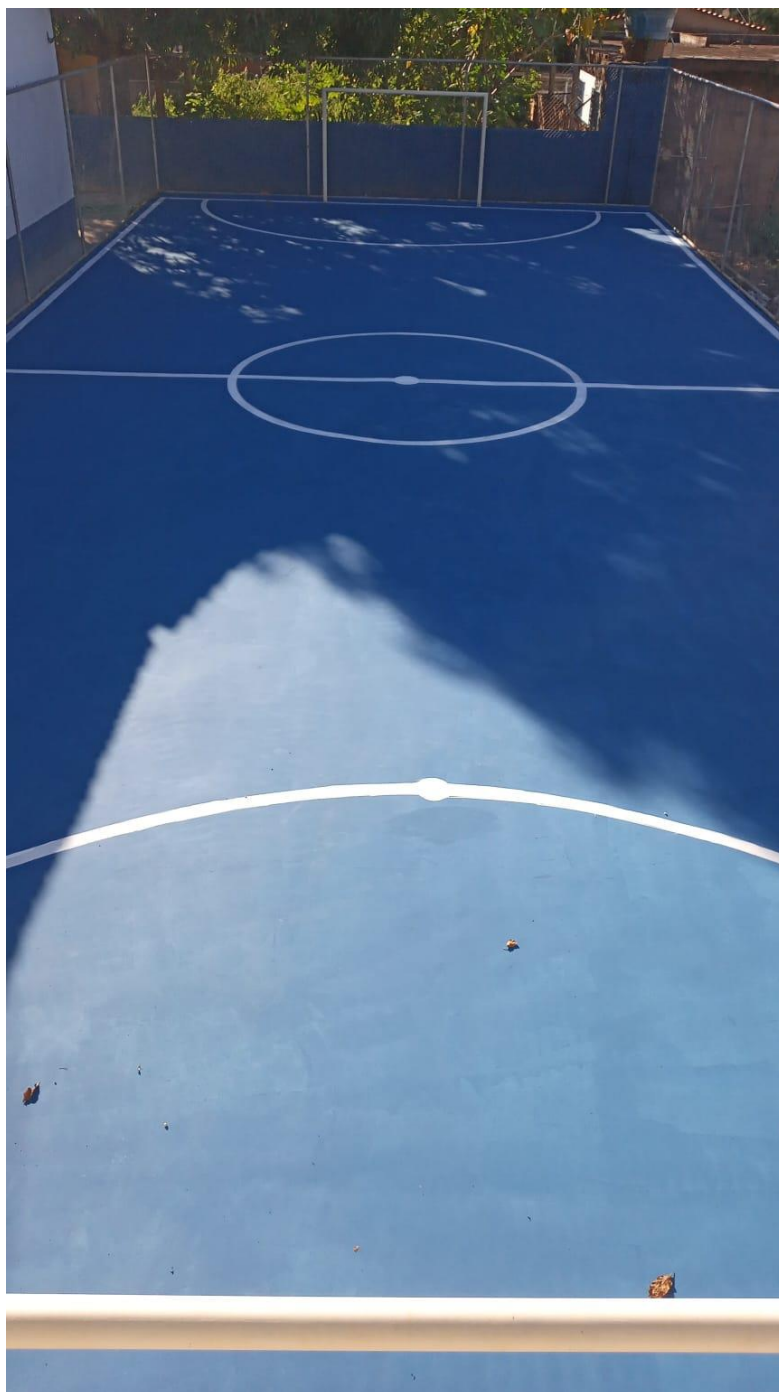





Carmo, 30 de maio de 2023

NATHAN XAVIER DE ARAUJO
FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS
FISCAL DA OBRA
