

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Obra:	Execução de obras de pavimentação e drenagem de ruas, Rua 1, Rua 2 e Rua Pereira de Carvalho de Porto Velho do Cunha, e, Rua Professora Leda Ribeiro, bairro Centro no município de Carmo-RJ
Endereço:	Rua 1, Rua 2 e Rua Pereira de Carvalho de Porto Velho do Cunha, e, Rua Professora Leda Ribeiro, bairro Centro no município de Carmo-RJ
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230047677
Número do contrato:	0055/2023
Número da tomada de preço:	0012/2022
Número da ordem de serviço:	003/2022
Prazo:	09 meses
Início:	14/08/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	14/05/2024
Valor:	R\$ 665.159,71
Termos aditivos:	-
Valores Pagos:	R\$ 222.864,05
Percentual executado:	33,50%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo





P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA





P R E F E I T U R A
CARMO
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA



26 de jan. de 2024 15:34:32



P R E F E I T U R A
CARMO
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA



Obra:	Construção de muro de contenção, na Rua José Joaquim da Cunha no bairro Jardim Centenário, no município de Carmo-RJ.
Endereço:	Rua José Joaquim da Cunha no bairro Jardim Centenário, no município de Carmo-RJ.
Empresa:	ATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230176530
Número do contrato:	00594/2023
Número da tomada de preço:	0013/2023
Número da ordem de serviço:	0012/2023
Prazo:	03 meses + 06 meses TA
Início:	13/07/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	13/04/2024
Valor:	R\$ 448.297,49 + R\$ 79.231,27 TA
Termos aditivos:	Prazo e valor
Valores Pagos:	R\$ 389.042,20
Percentual executado:	73,75%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo





Obra:	Construção de muro de concreto armado e substituição do pavimento em paralelepípedos, no bairro Botafogo, no município de Carmo-RJ.
Endereço:	Bairro Botafogo, no município de Carmo-RJ.
Empresa:	MC RODRIGUES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230176530
Número do contrato:	0458/2023
Número da tomada de preço:	007/2023
Número da ordem de serviço:	0010/2023
Prazo:	04 meses + 04 meses TA
Início:	26/06/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	26/02/2024
Valor:	R\$ 624.014,66
Termos aditivos:	Prazo
Valores Pagos:	R\$ 413.933,54
Percentual executado:	66,33%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo









Obra:	Pavimentação asfáltica a frio, no bairro Morro do Estado, bairro Botafogo, Distrito do Córrego da Prata, bairro Val Paraíso, bairro Influência e Rua Jair Nunes Macuco no município de Carmo-RJ
Endereço:	Bairro Morro do Estado, bairro Botafogo, Distrito do Córrego da Prata, bairro Val Paraíso, bairro Influência e Rua Jair Nunes Macuco no município de Carmo-RJ
Empresa:	3R SERV LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230149033
Número do contrato:	0452/2023
Número da tomada de preço:	001/2023
Número da ordem de serviço:	009/2023
Prazo:	06 meses + 06 meses TA
Início:	03/07/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	03/07/2024
Valor:	R\$ 2.325.094,62
Termos aditivos:	Prazo
Valores Pagos:	R\$ 868.543,59
Percentual executado:	37,36%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo





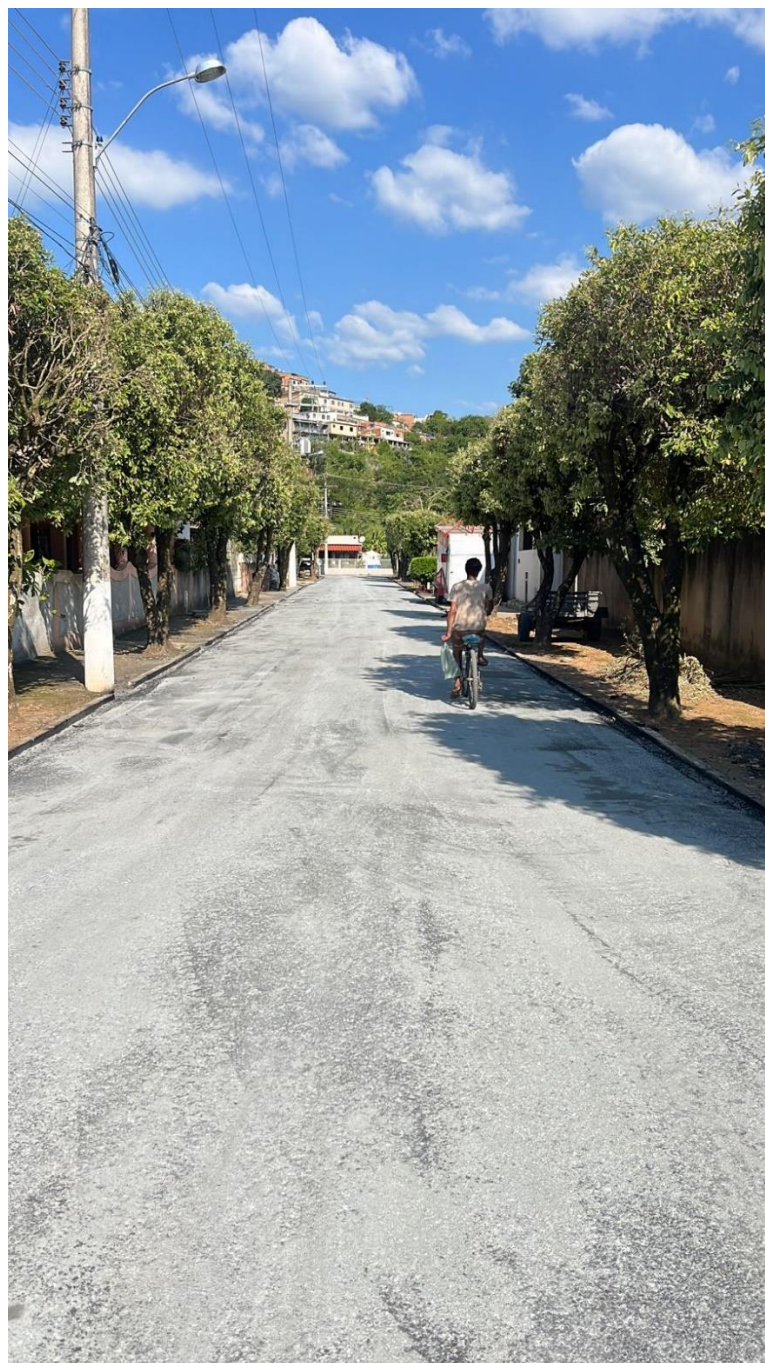

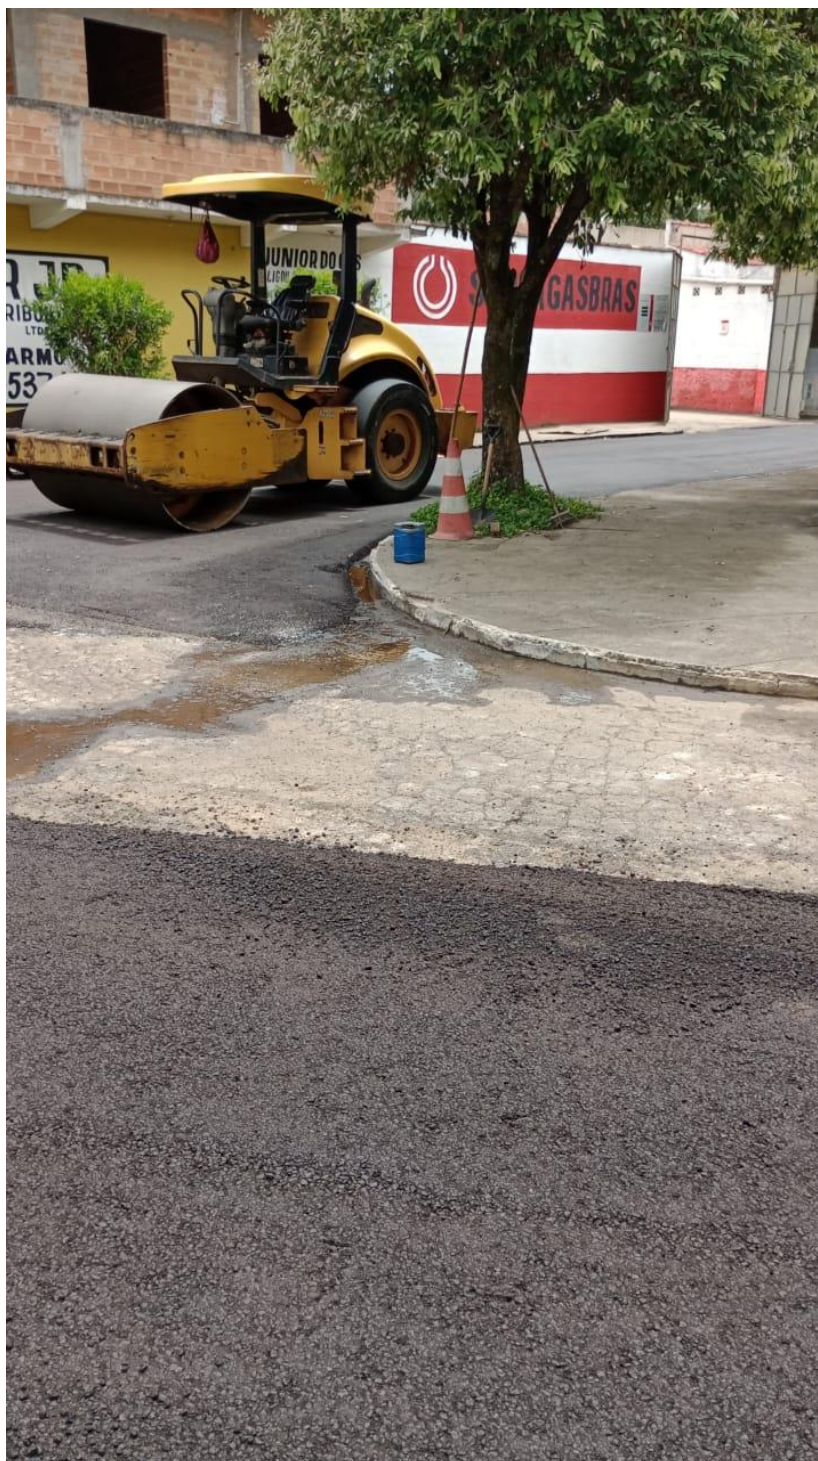

Carmo, 29 de janeiro de 2024
