



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
06/04/2026

**053 – EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA
PRAÇA OSMAR RIBEIRO DA SILVA – BAIRRO BOTAFOGO**


Data da vistoria:	01/04/2026
Obra:	Execução de obras de reforma e adequação da praça Osmar Ribeiro da Silva, bairro Botafogo
Endereço:	Rua Dr. Wilde Oscar Curty Ribeiro, Botafogo, Carmo-RJ
Empresa:	CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA – CNPJ Nº36.444.239/0001-06
RRT de Projeto e orçamento:	16361502
ART de projeto elétrico:	2020250373121
ART de execução:	xxxxxx
Número do contrato:	0166/2026
Nº da concorrência:	0001/2026
Nº da ordem de serviço:	003/2026
Prazo inicial:	5 meses
Início:	01/04/2026
Término:	01/09/2026
Valores Pagos:	0
Percentual executado:	0%
Fiscal da Obra:	Lídia de Moraes Lutterbach Pereira
Portaria de Nomeação de Fiscal:	061/2026
Tipo de recurso:	Recurso Próprio
Situação atual da obra:	Em execução

COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO





Imagem 01 –Projeto arquitetônico

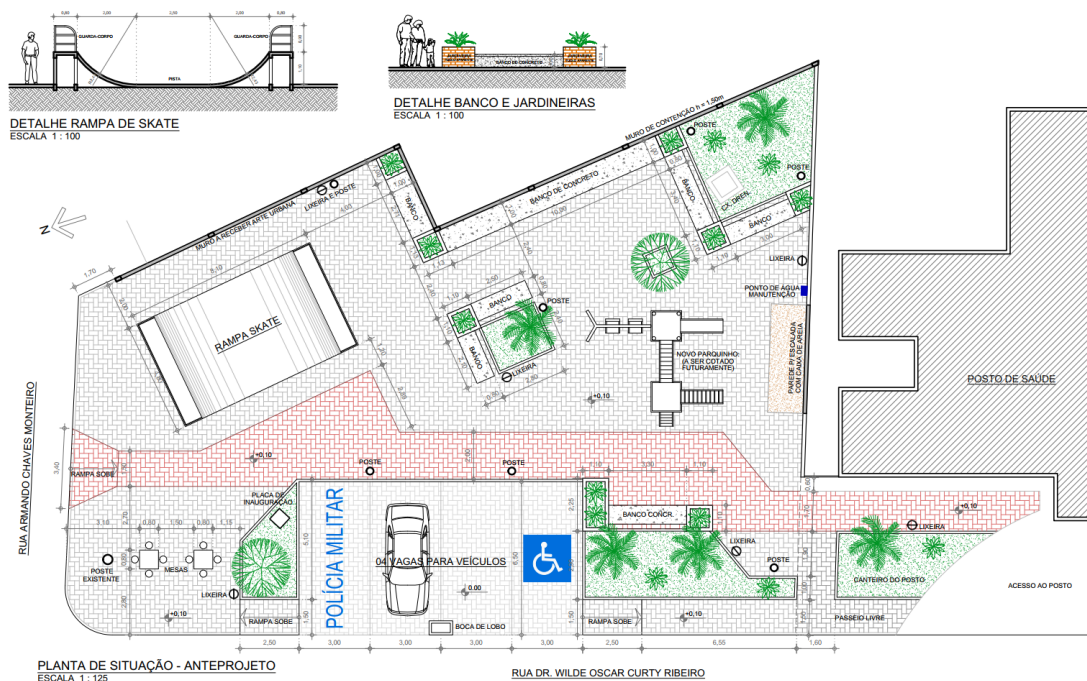

P R E F E I T U R A
CARMO

COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ


CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br





Imagem 02 –Projeto de instalações elétricas

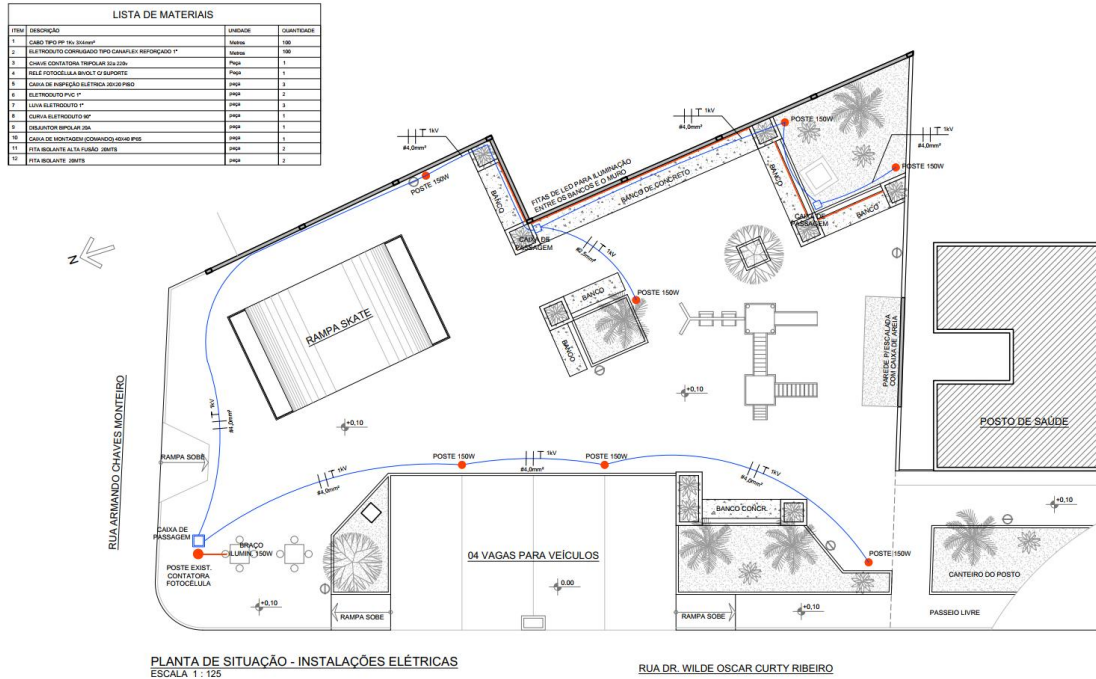

P R E F E I T U R A
CARMO

COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO

Lídia de Moraes Lutterbach Pereira
Fiscal de obras – Portaria nº 061/2026

