


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS


Obra:	Pavimentação asfáltica a frio, no bairro Morro do Estado, bairro Botafogo, Distrito do Córrego da Prata, bairro Val Paraíso, bairro Influência e Rua Jair Nunes Macuco no município de Carmo-RJ
Endereço:	Bairro Morro do Estado, bairro Botafogo, Distrito do Córrego da Prata, bairro Val Paraíso, bairro Influência e Rua Jair Nunes Macuco no município de Carmo-RJ
Empresa:	3R SERV LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230149033
Número do contrato:	0452/2023
Número da tomada de preço:	001/2023
Número da ordem de serviço:	009/2023
Prazo:	06 meses + 06 meses TA
Início:	03/07/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	03/07/2024
Valor:	R\$ 2.325.094,62
Termos aditivos:	Prazo
Valores Pagos:	R\$ 868.543,59
Percentual executado:	37,36%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo



P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**





P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a


SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA






P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA

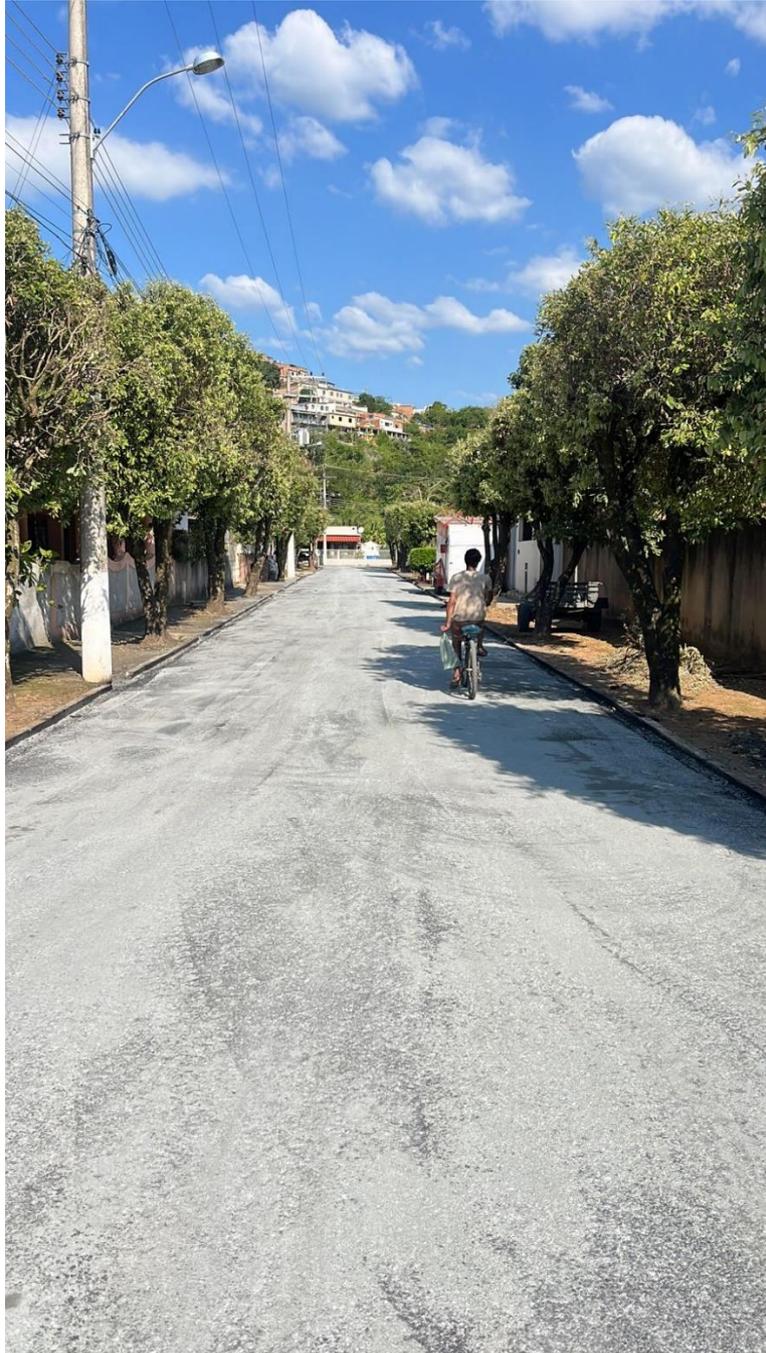



PREFEITURA
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**

